



PROJET ECMS RÉUNION DE PLACE

BANQUE DE FRANCE:

ALEXANDRE GAUTIER

DALIBOT VÉRONIQUE

CATAU OLIVIER

CORMEIL LARA


PALLISE RHIM

5 mai 2025

BDF-PUBLIC

BANQUE DE FRANCE
EUROSISTÈME

STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

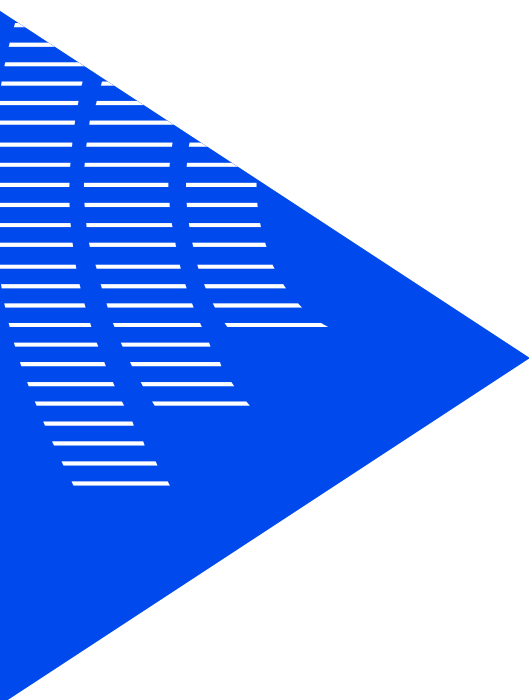

INTRODUCTION PAR ALEXANDRE GAUTIER


DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA STABILITÉ
FINANCIÈRE ET DES OPÉRATIONS



SOMMAIRE


- 1 ACTIVITÉS DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION DE PLACE
- 2 MIGRATION VERS LA PRODUCTION
- 3 FOCUS TECHNIQUE ET LEGAL
- 4 ANNEXES

PLANNING ECMS

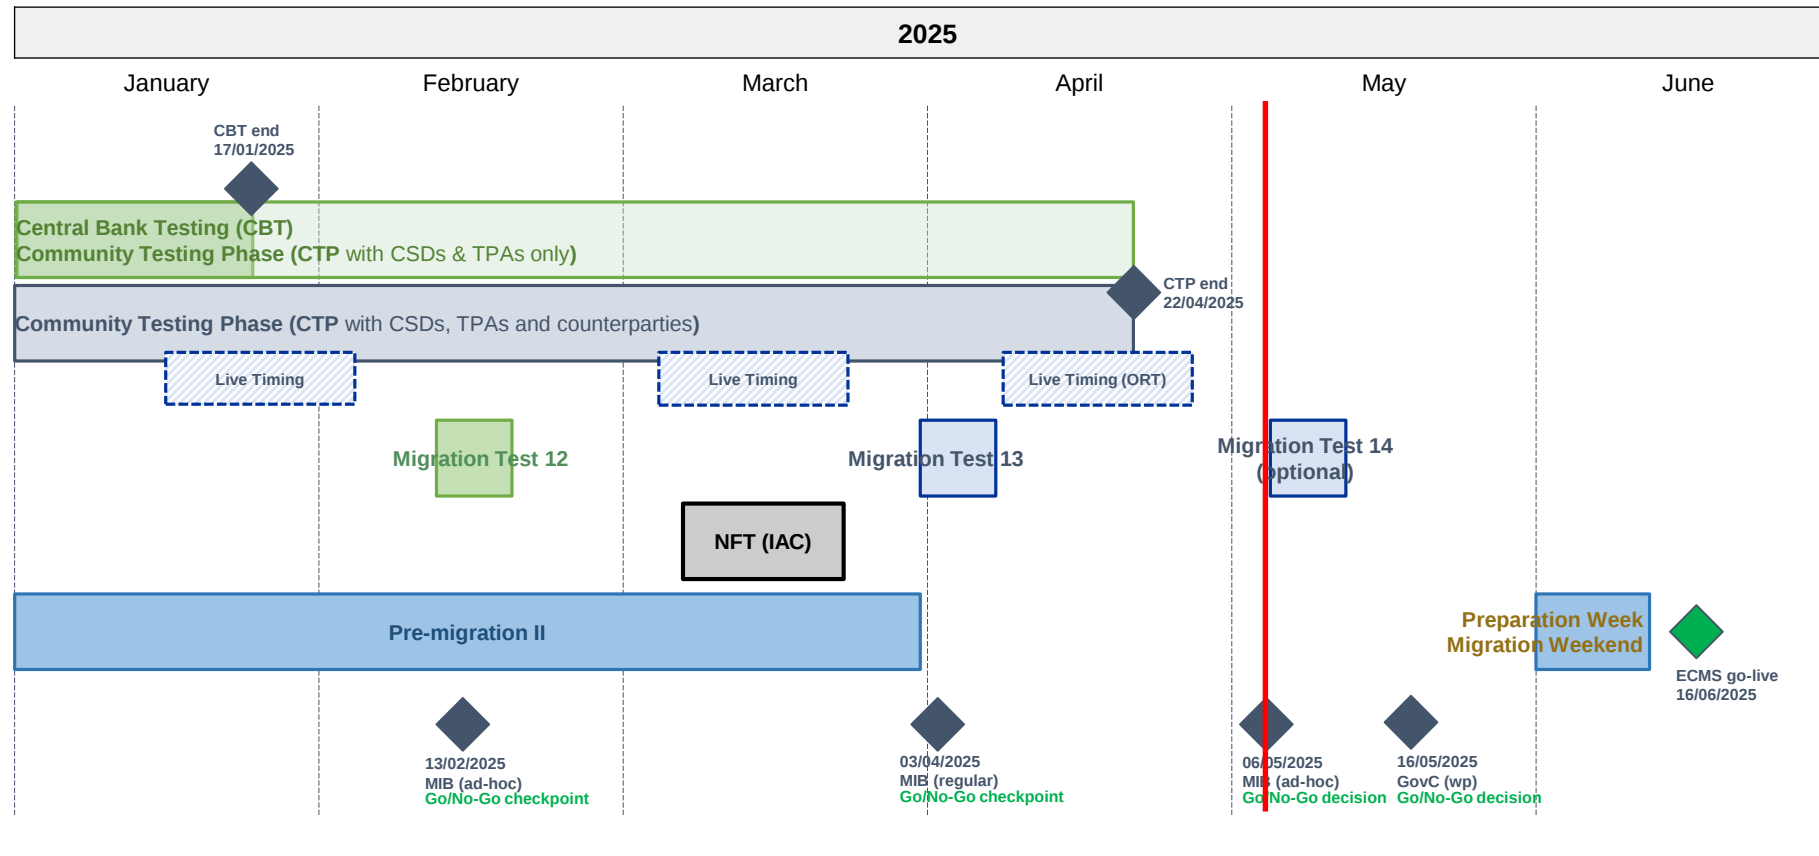

1

ACTIVITÉS DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION DE PLACE

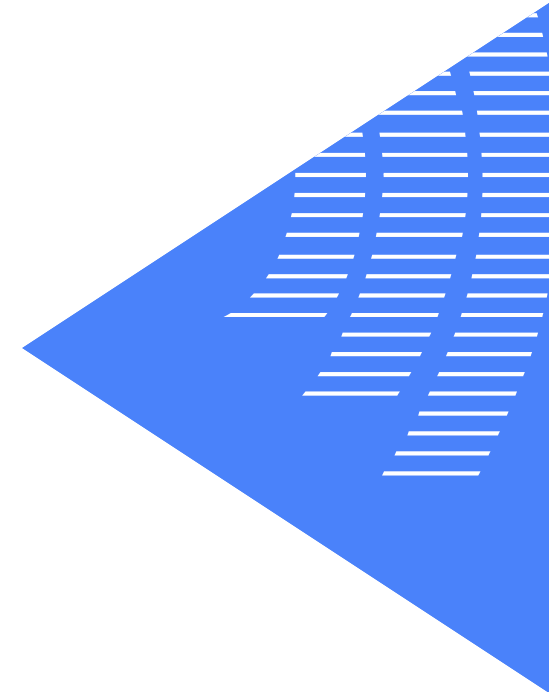

BILAN DE LA DERNIERE PHASE DE PRE-PRODUCTION

Phase de test contreparties (CPT2E)

- ▶ Terminée le 22 avril 2025
- ▶ 100% des contreparties ont reçu leur Rapport final sur les cas de tests réalisés

Phases de Live-timing (3 mars au 21 mars 2025 et 7 au 25 avril 2025)

- ▶ Test des flux et des process identiques à la production, avec succès
- ▶ Les journées opérationnelles se déroulent correctement
- ▶ Les procédures dégradées ont été testées

OPEN MARKET OPERATIONS (OMO), STANDING FACILITIES, CREDIT FREEZING

Open Market Operations (OMO)

- ▶ Depuis la dernière Réunion de place en février, 2 nouvelles campagnes OMO ont eu lieu :
 - **OMO campaign - 11/03 - 24/03 (pendant une période de live timing)** : 5 incidents créés par la BDF (2 pour non-chargement de certains allotments; 1 pour netting USD défaillant pour 1 entité; 1 pour ER non réglé pour 1 entité; 1 pour LT>RO non remboursés pour 2 entités) → Les problèmes de chargement en masse des OMOs ou de mise à jour des OMOS durant NTP1 ne semblent pas complètement résolus.
 - **OMO campaign - 09/04 – 22/04 (pendant une période de live timing)** : 2 incidents créés par la BDF = problèmes de remboursement de certains OMOs USD et LTRO, liés au retardement du changement de journée comptable le soir du jeudi 17/04 (juste avant deux jours fermés TARGET2), provoquant une désynchronisation entre ECMS et CLM. → **une mini-campagne OMO est prévue par la BCE en mai, pour tester les derniers correctifs.**
- ▶ Ces deux campagnes ont été réalisées en tests de bout-en-bout, avec saisie des soumissions par les contreparties dans TELMA Homologation.

Standing Facilities (MLOR & AML)

- ▶ Fonctionnalité stable.

Credit Freezing (type ECONS)

- ▶ Le dernier test en APPR est globalement satisfaisant pour les contreparties, mais suite à l'incident empêchant l'envoi des liquidités d'ECMS vers ECONS II, la BCE envisage de réaliser un nouveau test avant le go live. Date provisoire : le 12 mai de 9h à 12h.
- ▶ Nous demanderons à un nombre réduit de contreparties de réaliser ce nouveau test.

TITRES

Titres

- ▶ Domestique: Fonctionnalité stable, pas de blocage spécifique détecté
- ▶ Central Bank Access (CBA): Fonctionnalité stable, pas de blocage spécifique détecté
- ▶ CCBM:
 - Clearstream Bank Luxembourg: toutes les nationalités d'ISIN disponibles en LuxCSD ont été éprouvées et validées en U2A et / ou A2A en dehors des titres DK, qui seront testées en APPR après la MEP ECMS
 - Gel du périmètre au 25 avril, fin de journée.
- ▶ Pour rappel, il est nécessaire d'avoir validé les tests en pré-production pour pouvoir utiliser un couple ISIN + PSET (place de dénouement) en production
 - L'objectif de cette stratégie est de protéger les contreparties d'instructions non dénouées en environnement de production.
 - Le périmètre des tests a été validé avec les contreparties sur la base de:
 - Leur activité en PROD depuis début 2023
 - Leurs indications
 - Les contreparties sont autorisées à utiliser un couple à partir du moment où elles ont réussi une mob, une démob de ce titre ainsi que les annulations correspondantes
- ▶ **Les contreparties n'ayant pas participé à ces tests sont considérées comme ne faisant pas de CCBM.**

CREANCES PRIVEES

Fonctionnalités

- ▶ Les fichiers reçus se traitent bien et dans des délais satisfaisants. 2 problèmes « isolés » sur des fichiers bloqués en Processing qui ont dû être rejetés (2 contreparties différentes, 2 dates différentes) ;
- ▶ Les Processing Report se génèrent correctement. Lors des tests ECONs, quelques PR modificatifs n'ont pas été générés, mais les actions de contournement mises en place ont permis de résoudre la situation ;
- ▶ Lors d'incidents identifiés, les actions de contournement en place ont été globalement satisfaisantes et ont permis de débloquent les contreparties dans la journée ;
- ▶ Des problématiques ciblées et limitées en ampleur subsistent mais n'empêchent pas le traitement des instructions et l'actualisation des pools de collatéral.

CORPORATE ACTIONS

Fin des campagnes de tests OST : merci de nous contacter en cas de besoin spécifique

Fonctionnalités OST : stables pour les opérations courantes (coupons/maturités) – un PBI à finaliser pour le traitement des Reversal (rares en production)

Préparation de la migration / GoLive :

communication spécifique début juin et les jours précédents la migration nous vous inviterons à démobiliser les titres qui couponneraient ou arriveraient à maturité sur le weekend (annonce avant le 13/06 et OST à partir du 16/06)

Nous contacter :

Boîte mail BDF OST

4045-ECMS-OST-TESTS-UT@banque-france.fr

Sharebox

<https://share-box.banque-france.fr/share-access/sharings/EqzqqxYs.Eqqqqms0#/filer/share-access>

BILAN DU PMR13

Exercice de Migration 13 - du 28 mars au 6 avril 2025

- ▶ L'objectif de l'exercice a été atteint
- ▶ Données transactionnelles migrées et valorisées
- ▶ Credit lines envoyées vers Target, dans les délais qui seront requis lors de la MEP


Enseignements sur l'organisation

- ▶ Il est impératif de participer aux activités contreparties lors du week-end de migration et de faire les remontées dans les délais
- ▶ Problème de connexion: Veuillez à supprimer vos cookies et cache avant de redémarrer votre navigateur et recommencer la connexion
- ▶ Nous recommandons de ne pas répondre sur le SERI dédié aux bulletins d'information pour une meilleure gestion de vos demandes
- ▶ Il est également demandé de faire des retours distincts titres/créances privées
- ▶ Attention à ne pas faire de mail avec des pièces jointes chiffrées

Exercice de migration créances privées PMR13


- ▶ Réalisé entre le vendredi 28 mars (date d'arrêté) et le dimanche 6 avril (réconciliations des contreparties) ;
- ▶ Quelques points d'attention sur les fichiers « champs manquants » indiqués lors du TMC du 9 avril, à prendre en compte par les contreparties pour la migration fianle ;
- ▶ L'exercice a été globalement maîtrisé, le chronogramme global respecté ;
- ▶ La plupart des contreparties ont effectué des remises dès le lundi 7 avril.

PLANNING GENERAL

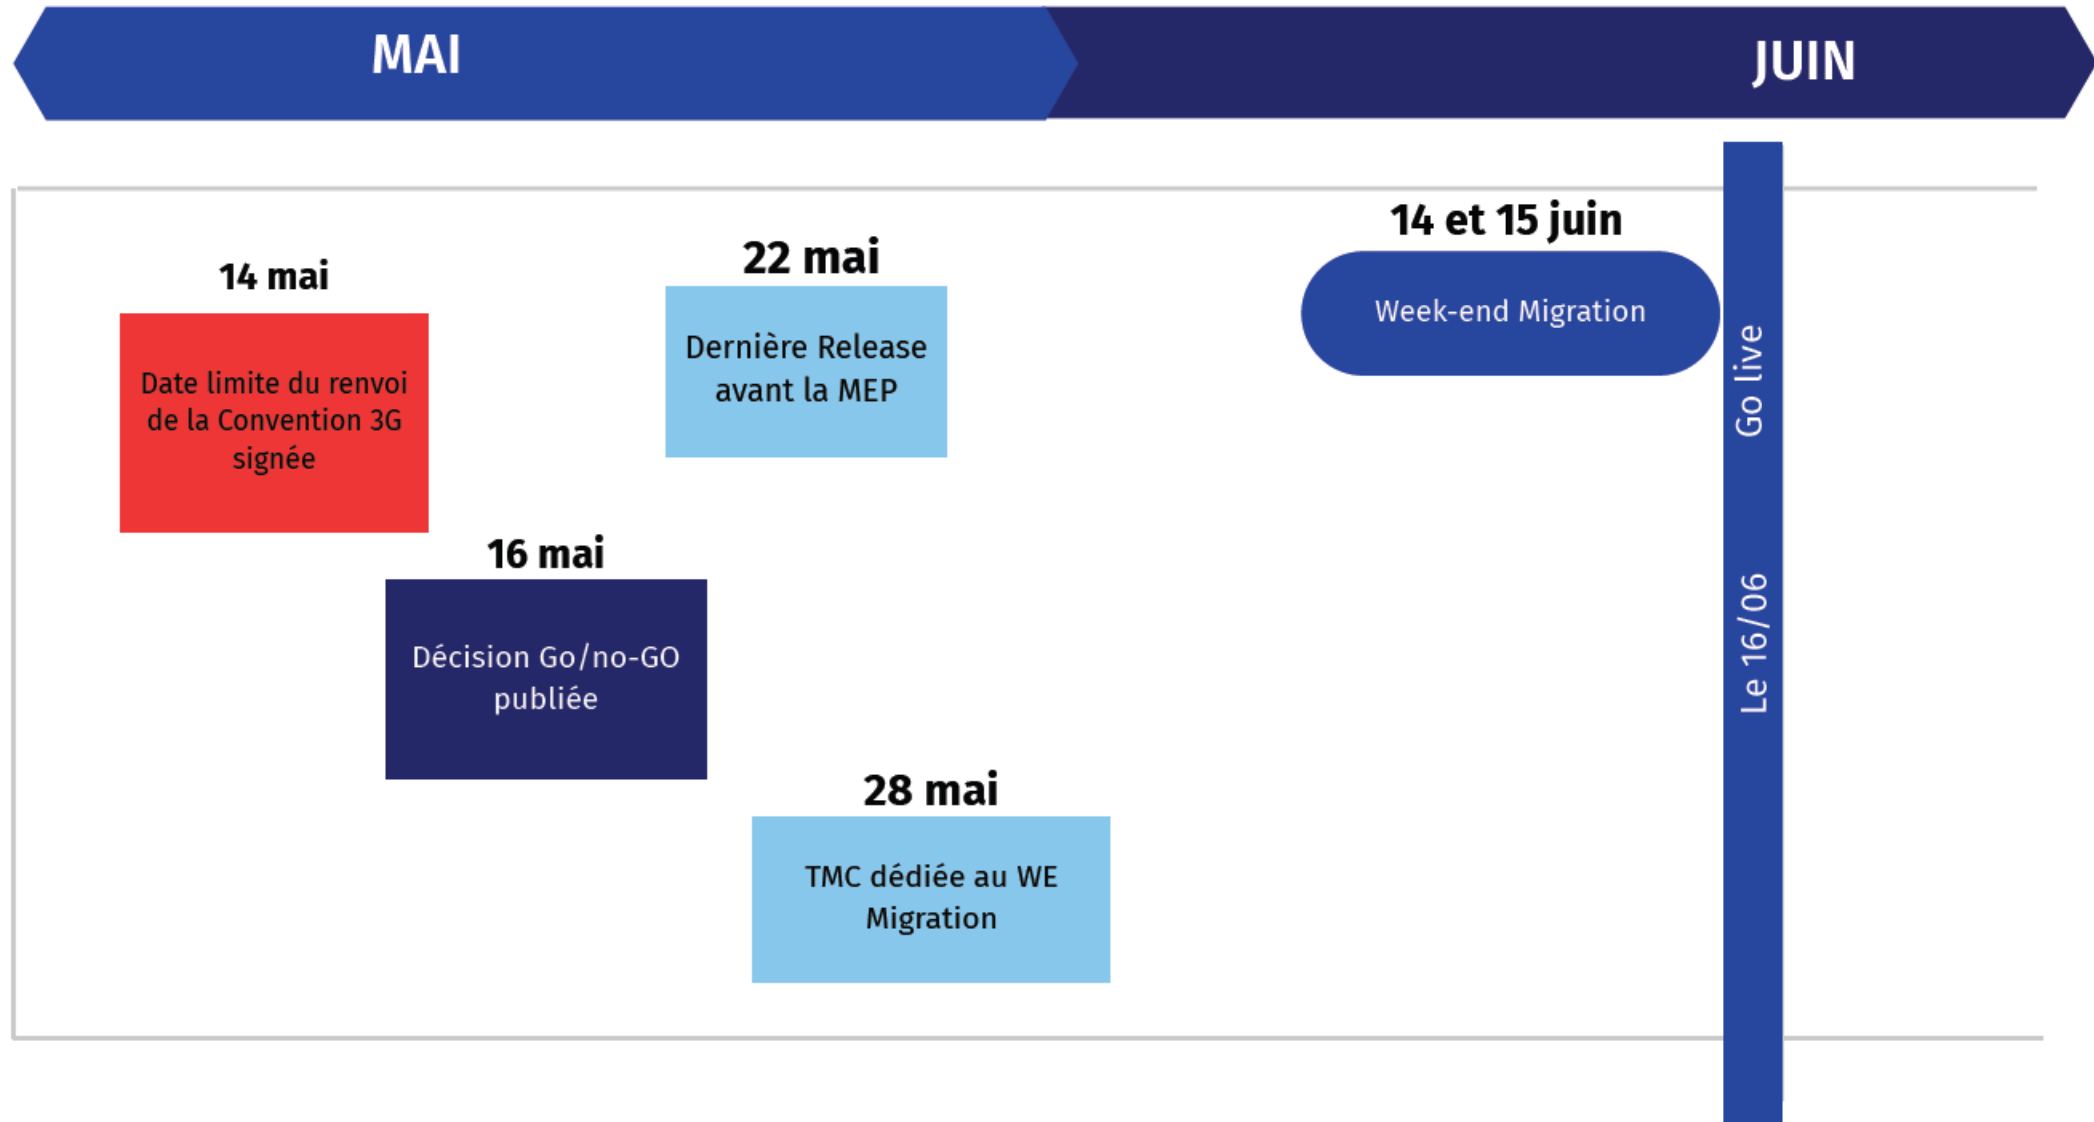


2

MIGRATION VERS LA PRODUCTION

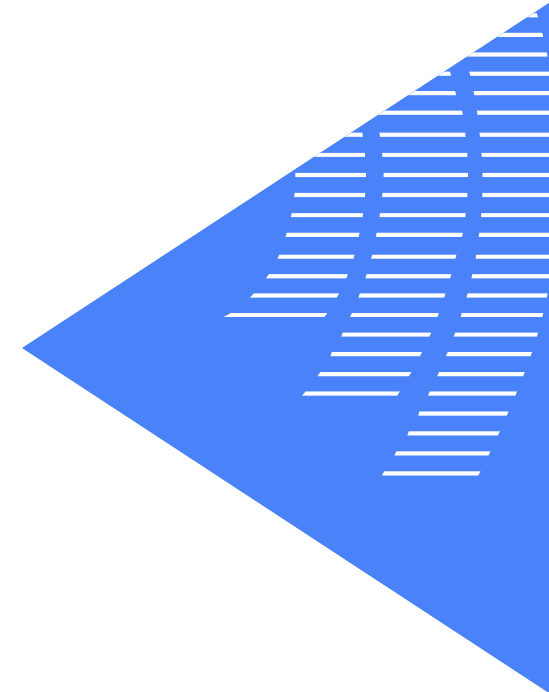

PHASES DES CYCLES DE MIGRATION

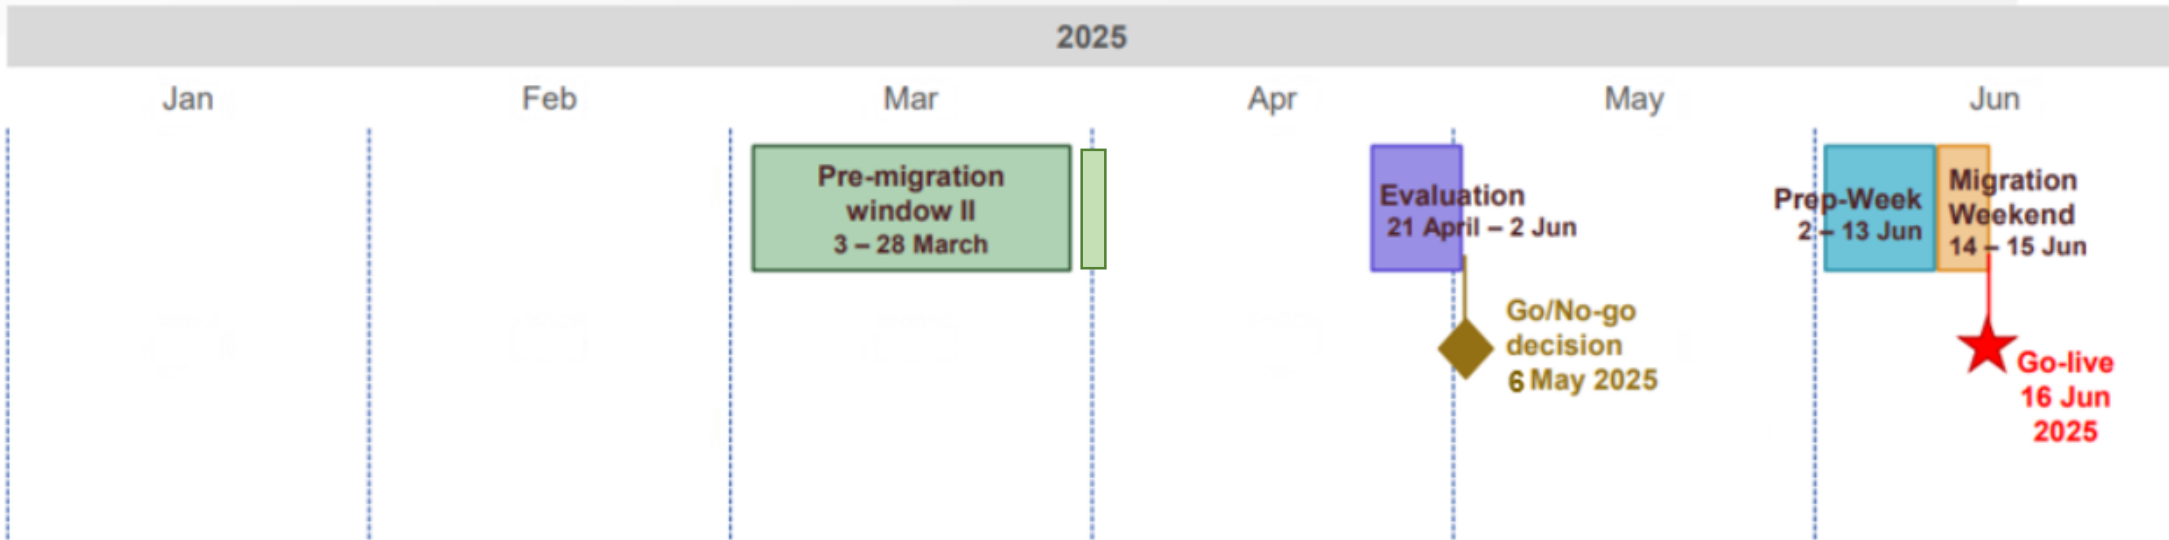

Pre-migration activities refer mostly to the set-up of reference data.

Evaluation phase is the phase in which the MIB will assess the go/no-go decision, based on prepared reports.

To prepare for the Migration Weekend, some activities need to be performed before the actual start of the weekend, for example to actualise the database.

During the Migration Weekend all activities related to transactional data migration will be executed.

SÉQUENCEMENT DE LA MIGRATION

PRINCIPAUX JALONS DE LA MIGRATION

QUELQUES RAPPELS

- ▶ Une phase de Pre Migration a précédé aux deux séquences de migration à venir avant le Go Live
- ▶ Cette phase de Pre Migration a consisté à paramétrer l'ensemble des données référentielles ECMS :
- ▶ Données d'identification des contreparties, structure des comptes, liens, opérations de politique monétaire autorisées pour une contrepartie, etc.
- ▶ Elle s'est conclue par l'exécution d'un test de connectivité A2A et U2A demandé à l'ensemble des contreparties de politique monétaire ainsi que des vérifications de leurs paramétrages.
- ▶ Deux phases succèderont à la Pre Migration :
 - La Preparation Weeks : du 02 au 13 juin
 - Le week-end de migration ; du 13 au 15 juin

SÉQUENCEMENT DE LA MIGRATION

JALONS PRINCIPAUX DE LA PHASE PREPARATION WEEKS (EXTRAIT DU SCHEDULE)

Task Name	Activity Id	Activity Name	Actor	Duration	Start	Finish
Go / No Go	GL to start migration	Green light to start the migration		0 mins	Tue 06/05/25 18:00	Tue 06/05/25 18:00
	Mig GL	Green-light to start the Migration of ECMS to PROD (i.e, go-decision by the MIB)	All	0 days	Tue 06/05/25 18:00	Tue 06/05/25 18:00
System Prep PW		Preparation of the PROD environment for the preparation weeks		600 mins	Fri 30/05/25 09:00	Fri 30/05/25 19:00
Snapshot		Snapshot prior to the start of the preparation weeks		150 mins	Fri 30/05/25 09:00	Fri 30/05/25 11:30
Queues Management		Queue and access management for the preparation weeks		450 mins	Fri 30/05/25 11:30	Fri 30/05/25 19:00
Cleanup		Data clean-up prior to the start of the preparation weeks		210 mins	Fri 30/05/25 13:00	Fri 30/05/25 16:30
Operational Day		Setup of the operational day for preparation weeks		45 mins	Fri 30/05/25 16:30	Fri 30/05/25 17:15
Operational Day	Business Day Change	ECMS Operational Day Management		20790 mins	Mon 02/06/25 08:00	Mon 16/06/25 18:30
		Daily changes of business date			Mon 02/06/25 08:00	Mon 16/06/25 18:30
MWCP2.0	Start of the Prep Weeks	Green light to start Migration Weekend Preparation Weeks Activities		0 mins	Mon 02/06/25 10:00	Mon 02/06/25 10:00
	MWCP2.0	Confirmation of the preparation of the environment and that ESCB flows are ready				
Preparation Weeks	Preparation Weeks	Migration Weekend Preparation Weeks		17760 mins	Mon 02/06/25 10:00	Sat 14/06/25 18:00
Ref. Data Synchronisation - T2S, CLM, TOP switch		Synchronisation of Reference Data with External Data Providers? DWH set, up, Provision of Ref Data to T2S, Activation of the switch of T2S CLM and TOP for ECMS		16020 mins	Mon 02/06/25 15:00	Fri 13/06/25 18:00
Credit Claims Ref. Data - 1st window		Migration of Credit Claims Reference Data - 1st window		15960 mins	Mon 02/06/25 10:00	Fri 13/06/25 12:00
Mig Prep. in local CMS		Prevention of undesirable instructions and freezing period Application of cut off and restrictions (assets, C.A.)		15960 mins	Mon 02/06/25 10:00	Fri 13/06/25 12:00
MWCP2.1	Completion of Migration WE Preparation Weeks	Completion of Migration Weekend Preparation Weeks Activities		0 mins	Fri 13/06/25 12:00	Fri 13/06/25 12:00

SÉQUENCEMENT DE LA MIGRATION

PRINCIPAUX JALONS DE LA MIGRATION

PREPARATION WEEKS

- ▶ La phase est destinée à préparer la phase de migration des données transactionnelles
- ▶ Son exécution et sa validation sont un prérequis au démarrage du week-end de migration
- ▶ En amont de la purge des données transactionnelles une snapshot est exécutée par l'Opérateur ECMS
- ▶ Diverses actions sont effectuées lors de ces deux semaines
- ▶ Les ECMS CC. sont migrées la semaine du 09 juin, après le recueil des champs manquants, les vérifications et la consolidation des fichiers
- ▶ Une fois migrées, un rapport comportant les ECMS CC ID est communiquée à la BCN
- ▶ La BCN effectue une vérification et une réconciliation
- ▶ Une fois que l'activité est validée, le fichier avec les ECMS CC ID de la CTPY lui est communiqué (cadre des activités de la phase du week-end de migration)

SÉQUENCEMENT DE LA MIGRATION

JALONS PRINCIPAUX DE LA PHASE MIGRATION WEEKEND (EXTRAIT DU SCHEDULE) 1/2

Task Name	Activity Id	Activity Name	Actor	Duration	Start	Finish
MWCP2.2	Start of Migration Weekend	Confirmation that the Migration Weekend activities can start		0 mins	Fri 13/06/25 20:00	Fri 13/06/25 20:00
	MWCP2.2	Confirmation of T2S,CLM,TOP switch to ECMS configuration request, Confirmation of the provision of reference data to T2S	ECB Migration Coordinator	0 mins	Fri 13/06/25 20:00	Fri 13/06/25 20:00
Migration Weekend	Migration Weekend	Migration Weekend		2580 mins?	Fri 13/06/25 20:00	Sun 15/06/25 15:00
Transactional DDT files Preparation		Preparation and upload of DTT file for migration of transactional data		660 mins	Fri 13/06/25 20:00	Sat 14/06/25 07:00
MWCP2.3	DTT files uploaded	Confirmation that all Transactional Data DTT files are uploaded		0 hrs	Sat 14/06/25 07:00	Sat 14/06/25 07:00
Migration of Credit & collateral Positions		Migration of Credit & collatera Positions		960 mins	Fri 13/06/25 20:00	Sat 14/06/25 12:00
MWCP2.4	Credit and Collateral Positions Migrated	Confirmation of the migration of collateral and credit positions		0 mins	Sat 14/06/25 14:00	Sat 14/06/25 14:00
	MWCP2.4	Migration managers confirm the successful completion of the migrated collateral and credit positions	NCB Migration Managers	0 mins	Sat 14/06/25 14:00	Sat 14/06/25 14:00
Pool Valuation		1st Pool Valuation		245 mins	Sat 14/06/25 14:00	Sat 14/06/25 18:05
Pool Value Check		Check pools credit and collateral values		120 mins	Sat 14/06/25 18:05	Sat 14/06/25 20:05
MWCP2.5	Pool Valuated	Confirmation of the pool valuation processes		0 mins	Sat 14/06/25 21:05	Sat 14/06/25 21:05
Generation of GLF Record Type A		Generation of GL files for accrued interest over the weekend		60 mins	Sat 14/06/25 21:05	Sat 14/06/25 22:05
Send Check MCL to CLM	Check Credit Lines and Payments in CLM	Sending MCL and Payments to CLM & check Credit Lines and Payments in CLM		105 mins	Sat 14/06/25 21:05	Sat 14/06/25 23:50
MWCP2.6	CLM impacted	Confirmation of the CL update in CLM and generation of GLF		0 mins	Sat 14/06/25 23:50	Sat 14/06/25 23:50
CA Migration & Processing		Migration of ongoing CA events and processin		570 mins	Sat 14/06/25 21:05	Sun 15/06/25 06:35

SÉQUENCEMENT DE LA MIGRATION

JALONS PRINCIPAUX DE LA PHASE MIGRATION WEEKEND (EXTRAIT DU SCHEDULE) 2/2

Task Name	Activity Id	Activity Name	Actor	Duration	Start	Finish
MWCP2.7	Readyness to open ECMS to CPTY	Greenlight to open the system to the counterparties		0 mins	Sun 15/06/25 06:30	Sun 15/06/25 06:30
	MWCP2.7	Migration managers give the green light to open the system to the counterparties	NCB Migration Managers	0 days	Sun 15/06/25 06:30	Sun 15/06/25 06:30
Reactivation of CPTY users		Reactivation of the counterparty's users		30 mins	Sun 15/06/25 06:30	Sun 15/06/25 07:00
	ECMS.MW.OP.CPTYACT	Execute script to reactivate CPTY users access to the ECMS	ECMS operator	30 mins	Sun 15/06/25 06:30	Sun 15/06/25 07:00
	ECMS.MW.NCB.CPTYINF ORM	Inform Counterparty they can access to the ECMS	NCB Migration Managers	0 mins	Sun 15/06/25 07:00	Sun 15/06/25 07:00
CPTY checks		Counterparties checks of the migrated positions		360 mins	Sun 15/06/25 07:00	Sun 15/06/25 13:00
	ECMS.MW.CPTY.U2APO OL	Pool positions checks by the counterparties in U2A	Counterparties	6 hrs	Sun 15/06/25 07:00	Sun 15/06/25 13:00
	ECMS.MIG.POOL.REP	Generation of the pool positon reports upon reception of admi.005	Counterparties	6 hrs	Sun 15/06/25 07:00	Sun 15/06/25 13:00
Penny testing		Penny test		300 mins	Sun 15/06/25 07:00	Sun 15/06/25 12:00
	ECMS.MW.CPTY.PENN	Sample MA mobilisation instructions as part of the penny test	Counterparties	5 hrs	Sun 15/06/25 07:00	Sun 15/06/25 12:00
Sync. Point - T2/T2S MW	Sync. Point - T2/T2S MW	Start of T2 and T2S Maintenance Windows		0 mins	Sun 15/06/25 10:00	Sun 15/06/25 10:00
MWCP2.8	End of Migration Weekend	End of Migration Weekend Activities		0 mins	Sun 15/06/25 13:00	Sun 15/06/25 13:00

DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

LIVRABLES CLÉS

Site public de la BCE & ECMS MWP Schedule for CTPY version

- ▶ [Strategy for ECMS migration and testing](#)
- ▶ [ECMS info pack - user testing and migration](#)
- ▶ La BCE a communiqué une version à destination des CTPY du Migration Weekend Playbook Schedule.
- ▶ Il s'agit d'une version préliminaire, en cours de revue, qui pourrait évoluer jusqu'à sa validation finale.
- ▶ Il donne une vision fine des activités qui precedent l'ouverture de l'environnement aux CTPY même s'il n'est qu'un extrait du Schedule general. Il s'agit d'une version non validée (corrections déjà attendues sur certains éléments)


RÔLES DES CONTREPARTIES

CONTRÔLES, PENNY TESTS ET MONITORING


- ▶ Lors de la validation du checkpoint 2.7 le projet ECMS donne le Go aux BCNs pour l'ouverture de l'environnement de PROD ECMS aux CTPY
- ▶ L'environnement sera en business day au 16/06 à l'ouverture le dimanche
- ▶ Les contreparties disposeront d'une fenêtre de quelques heures pour :
 - Tester leur connectivité (obligatoire pour toutes les contreparties)
 - Executer leur penny test
 - Effectuer le monitoring
 - Générer des pools positions reports
- ▶ Une maintenance window T2s est prévue, à 10h, sous réserve de validation du Schedule
- ▶ Les jalons ne sont pas encore validés, le Schedule doit passer un cycle de revue avant sa finalisation
- ▶ Les précédents exercices de migration ont permis aux CTPY de prendre connaissance sous un angle pratique de l'enchaînement des activités.

3

FOCUS TECHNIQUE ET LEGAL

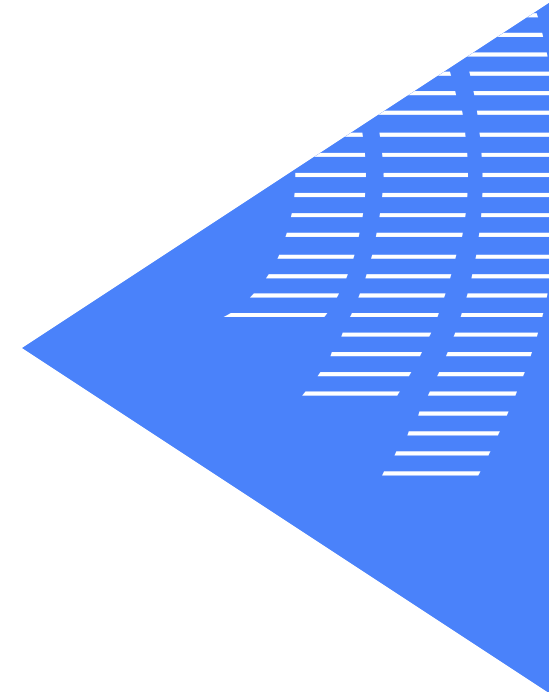

PLANNING TITRES & CRÉANCES PRIVÉES

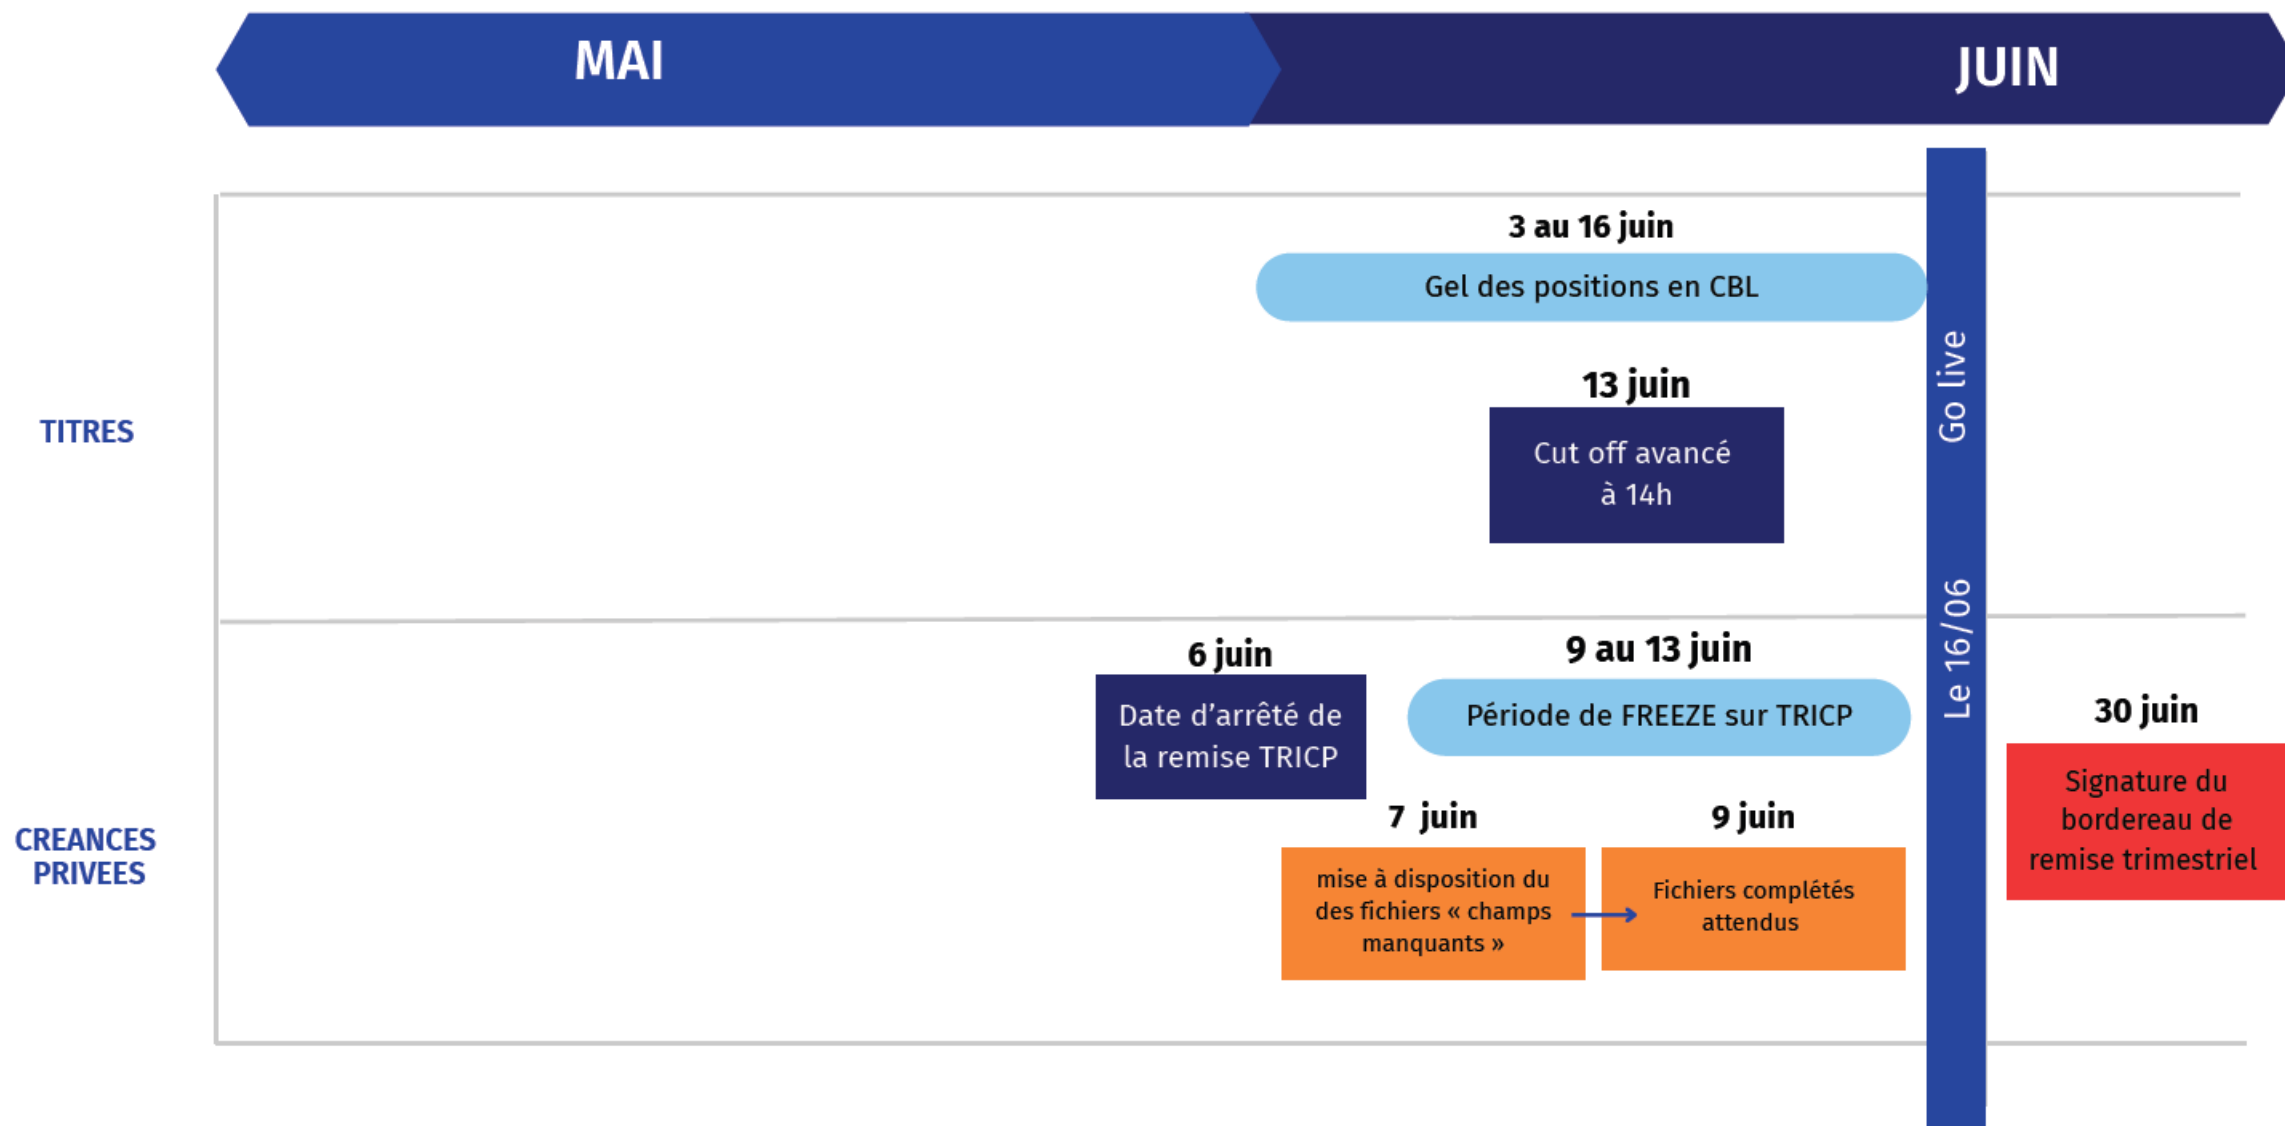

STRATÉGIE DE MIGRATION DES TITRES

Clearstream Bank Luxembourg → LuxCSD

- ▶ Gel des positions du 03 juin 2025 au 16 juin 2025 (date de la mise en production d'ECMS)
- ▶ Titres toujours valorisés donc impactant toujours votre pool
- ▶ Pas de mobilisation / démobilisation possible tant que ECMS n'est pas mis en production
- ▶ La Banque du Luxembourg se charge de la migration, qui sera donc transparente pour les contreparties

Cut-off avancé vendredi 13 juin 2025

- ▶ Le cut-off de production sera avancé à 14h pour l'intégralité des instructions de (dé)mobilisation de titres: Domestiques, CCBM, TPA.

STRATÉGIE DE MIGRATION DES CRÉANCES PRIVÉES

Date d'arrêt de la remise TRICP

- ▶ Date de la remise : vendredi 6 juin 2025
- ▶ Date de valeur : lundi 9 juin 2025
- ▶ Les fichiers « champs manquants » seront mis à disposition le samedi 7 juin 2025 EoD
- ▶ Fichiers complétés attendus pour lundi 9 juin 2025 13h. **Attention** : lundi de Pentecôte

Période de FREEZE sur TRICP

- ▶ La dernière remise effective dans TRICP sera attendu le **vendredi 6 juin 2025** => nécessaire pour garantir que les créances migrées dans ECMS correspondent aux créances mobilisées jusqu'à la fin de semaine
- ▶ Aucune remise à réaliser entre 9 et 13 juin 2025 (5 journées)
- ▶ **Attention** : Recalcul automatique par la Banque de France **tous les jours** afin d'actualiser la valorisation des créances pour toutes les contreparties. Visible dans POBI tous les matins du 10 au 13 inclus

Impact sur le pool pendant la semaine de freeze (POBI)

- ▶ Actualisation tous les jours du 9 au 13 juin dans POBI
- ▶ S'assurer d'avoir suffisamment de collatéral par rapport aux utilisations / être en capacité d'apporter du collatéral cash ou titres si besoin

STRATÉGIE DE MIGRATION DES CRÉANCES PRIVÉES

Remises ACC (créances PGE)

- ▶ Les PGE ne migrent pas dans ECMS
- ▶ **Pas de période de freeze prévue** = les remises seront attendues tous les jours, y compris pendant la semaine précédant la MEP ECMS
- ▶ La Banque de France enverra le flux ACC vers ECMS pour l'initialisation pendant le WE de migration, puis quotidiennement
- ▶ Information importante : La BCE a annoncé sur son site que les [PGE resteront éligibles a minima jusqu'à fin 2026](#). Ce Communiqué acte par ailleurs la fin du dispositif ACC (hors exceptions ciblées telles que les PGE) et l'intégration de certaines dispositions du cadre temporaire dans le cadre permanent (ABS de CQS3, titres dans certaines devises, etc.).

Mise en production nouvelle version ACC

- ▶ Mise en production le **jeudi 12 juin EoD**
- ▶ Changement déjà connu : Priorisation ICAS
- ▶ Rappel : Arrêt de l'acte de remise dans Onegate à partir de la remise du 13 juin (valeur 16 juin)
- ▶ Tests menés en environnement d'homologation ACC pendant le live-timing, et l'environnement reste disponible pour quelques semaines encore

Impact sur le pool (POBI)

- ▶ Les montants continueront à être actualisés quotidiennement jusqu'au vendredi 13 juin (remise du 12 juin)
- ▶ A partir du lundi 16 juin, le montant sera actualisé quotidiennement dans ECMS

DOCUMENTATION LEGAL

Les Décisions du Gouverneur de la Banque de France qui entreront en vigueur le 16 juin prochain (avec la mise en production d'ECMS) ont été publiées et sont disponibles sur le site internet de la Banque de France :

- ▶ La décision 2025-01 modifiant la décision 2015-01 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire et du crédit intrajournalier de la Banque de France : <https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/decision-ndeg-2025-01-du-16-avril-2025-modifiant-la-decision-ndeg-2015-01-du-22-avril-2015-relative>
- ▶ La décision 2025-02 relative à la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l'Eurosystème : <https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/decision-ndeg2025-02-du-16-avril-2025-relative-la-gestion-des-garanties-dans-les-operations-de>

DOCUMENTATION CONTRACTUELLE

- ▶ Les conventions de gestion globalisée des garanties (3G) conclues entre la Banque de France et les contreparties ont été revues pour prendre en compte le passage à ECMS.
Elles ont été envoyées début avril 2025 et devront être signées par une personne habilitée (niveau 1) et renvoyé pour le 14 mai 2025.

- ▶ Un document technique reprendra en complément les principaux éléments techniques nécessaires pour pouvoir utiliser ECMS. Notamment:
 - ▶ Étapes techniques pour rejoindre ECMS (contacts, documents tels que le registration form...)
 - ▶ Étapes réglementaires notamment sur les créances privées : choix de source, accords CCBM
 - ▶ Modèles de documents pour la gestion courante : acte de remise, mode dégradé
 - ▶ Le document sera disponible sur le site de la Banque de France d'ici juin 2025

ORGANISATION POUR LA MISE EN PRODUCTION AU 16 JUIN 2025

Campagne de recensement des contacts de production

- ▶ Merci de nous retourner le fichier complété d'ici le 14 mai, fin de journée. Ce fichier nous permettra de mettre à jour notre base de contacts opérationnels en vue du Go-Live.
- ▶ SERI250424144292

A l'ouverture de ECMS en production

- ▶ De 06h10 à 08h30 : Pour toute demande urgente (Indisponibilité de l'application, une fonctionnalité d'ECMS, fichier non reçu , Position /Créance manquante) merci de contacter CESAR 2315-ECMS-UT@banque-france.fr
- ▶ À partir de 08h30 : Les demandes devront être transmises à ARC

Communication des informations plus précises lors du TMC dédié du 28 mai 2025




PROCHAINE REUNION DE PLACE

8 SEPTEMBRE 2025

BILAN DE LA MISE EN PRODUCTION

4

ANNEXES

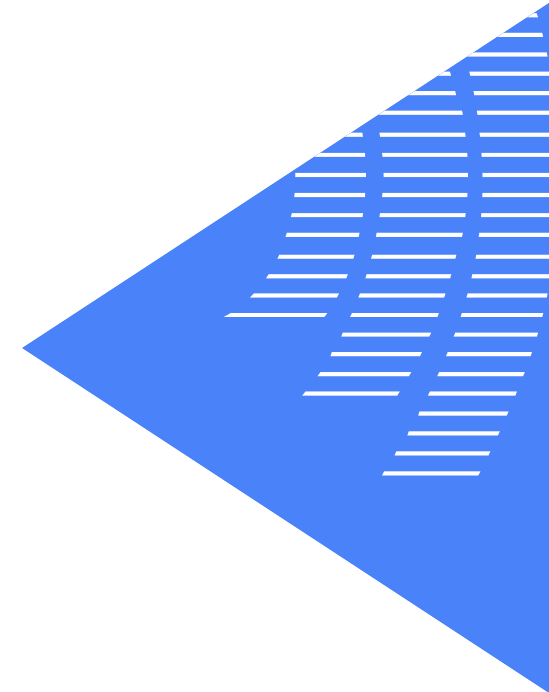

LISTE DES ACRONYMES

A2A	Application-to-Application	EOF	Euroclear France
ACC	Additional Credit Claim	FTD	Fixed term deposit
AMI-SeCo	Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral	GUI	Graphical User Interface
		HCB	Home Central Bank
BCN	Banque Centrale Nationale	MCA	Main Cash Account
CCB	Correspondent Central Bank	MLOR	Marginal Lending On Request
CCBM	Correspondent Central Bank Model	NSP	Network Service Provider
CCOAU	Credit Claim Outstanding Amount Update	OMO	Open Market Operation
CCR	Credit Claim Registration	OST	Opération sur titres
CCU	Credit Claim Update	RR	Rating Registration
CLM	Central Liquidity Management	RU	Rating Update
CTPY	Counterparty	SF	Standing Facilities
CSD	Central Securities Depository	TIPS	TARGET Instant Payment Settlement
CSLD	ConSoLiDation project	T2S	TARGET-2 Securities
ECMS	Eurosystem Collateral Management System	TPA	Triparty Agent
ECONS	Enhanced Contingency Services	U2A	User-to-Application

ACTIVITÉS DE MIGRATION MEP PROD – CORPUS TRANSACTIONNEL

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES CTPY

Activité	Actor	Duration	Start	End
Reception of the ECMS CC ID and integration	CTPYs	--	From 13/06/2025 12:00	
Reception of the IRB ratings and integration	CTPYs	--	From 13/06/2025 12:00	
Reception of the CC valuation and integration	CTPYs	--	From 15/06/2025 07:00	

Activité	Actor	Duration	Start	End
Inform Counterparty they can access to the ECMS	NCBs	0 mins	15/06/2025 07:00	15/06/2025 07:00
Counterparties checks of the migrated positons	--	5 hrs	15/06/2025 07:00	15/06/2025 12:00
Pool positions checks by the counterparties in U2A	Counterparties	5 hrs	15/06/2025 07:00	15/06/2025 12:00
Generation of the pool positon reports upon reception of admin.005	Counterparties	5 hrs	15/06/2025 07:00	15/06/2025 12:00
Penny testing	Sample CTPYs & CSDs	4 hrs	15/06/2025 07:00	15/06/2025 11:00
Sample MA mobilisation instructions as part of the penny test	Selected CTPYs	4 hrs	15/06/2025 07:00	15/06/2025 11:00
CSD payments on T2S CBCA to ensure camt.054 are received to ECMS	Selected CSDs	4 hrs	15/06/2025 07:00	15/06/2025 11:00

ACTIVITÉS DE TEST DE MIGRATION MEP PROD – CORPUS TRANSACTIONNEL

FENETRE DE PRE-MIGRATION en production

- ▶ Vérification par les contreparties des données référentielles configurées par la Banque de France sur la base du formulaire Registration Form: 6 contreparties n'ont pas fait de retour
- ▶ Ces contreparties seront contactées pour participer au penny test du dimanche 15 juin 2025.
- ▶ Ré-ouverture de la production le dimanche 15 juin: Réconciliation
- ▶ Lundi 16 juin: connexion de toutes les contreparties attendue à 7h

Indications préliminaires:

- ▶ Cut-off en APPR à 14h le vendredi 13 juin
- ▶ Date de valeur du 16/06/2025 pour le pool position report et pour la réconciliation
- ▶ Faire les remontées dans les délais
- ▶ Connexion: Veuillez à supprimer vos cookies et cache avant de redémarrer votre navigateur et recommencer la connexion.
- ▶ Nous recommandons de ne pas répondre sur le SERI dédié aux bulletins d'information pour une meilleure gestion de vos demandes.
- ▶ Il est également demandé de faire des retours distincts titres/créances privées.
- ▶ Attention à ne pas faire de mail avec des pièces jointes chiffrées.
- ▶ Mode opératoire de la génération ad-hoc du Pool Position Report via admi.005 en cours de rédaction

PRÉPARATION À LA MISE EN PRODUCTION – FOCUS TITRE

Migration des titres CBL vers LuxCSD

- ▶ Tous les CSDs connectés à ECMS devront également être connectés à T2S.
- ▶ L'actuel CSD luxembourgeois Clearstream Bank Luxembourg (CBL) n'étant pas connecté à T2S, c'est LuxCSD qui le remplacera comme dépositaire central de titres après la mise en production d'ECMS, prévue le 16 juin 2025.
- ▶ L'actuelle plateforme de gestion de collatéral de politique monétaire utilisée par la Banque de France n'offrant pas la possibilité d'interagir avec LuxCSD, il sera nécessaire de transférer depuis CBL vers LuxCSD les positions détenues par les contreparties françaises avant la mise en production d'ECMS.
- ▶ Cela permettra aux contreparties françaises de pouvoir gérer leur collatéral dès que ECMS sera mis en production.
- ▶ Cette migration aura lieu **mardi 03 juin 2025**.
- ▶ **Période de gel** : entre le 03 juin et le 16 juin 2025, il ne sera donc plus possible de :
 - Démobiliser les positions migrées ;
 - Mobiliser des titres vers CBL / LuxCSD.
- ▶ Les montants mobilisés continueront néanmoins d'alimenter la ligne de crédit des contreparties concernées.
- ▶ **Aucune action n'est attendue de votre part.**
- ▶ Vous serez informés au fur et à mesure du déroulement de la migration.



STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS
